

# 北見市上下水道審議会資料

平成 26 年 9 月 1 日

## 目 次

- |   |     |
|---|-----|
| 1. 上下水道ビジョンの進捗状況について . . . . .          | 1～5 |
| 2. 上下水道中期経営プラン（後期）の<br>策定について . . . . . | 6～7 |
| 3. 市民アンケート結果について . . . . .              | 別冊  |

企 業 局



# 1. 上下水道ビジョンの進捗状況について

## 《数値目標の状況一覧》

### 基本目標1. 安全で快適な生活環境の確保

指標名	指標の持つ意味 (算出式)	現状 H20	実績数値		目標 H26	目標 H31	備考
			H24	H25			
1-3-① 水道普及率	水道水を利用している人の割合 (給水人口/行政区域内人口)	94.2%	93.9%	94.0%	96.5%	98.6%	行政区域内人口等の減少により、数値に大きな変動は見られないが、ほぼ計画通り実施している。
1-3-① 下水道普及率	下水道・漁業集落排水が利用可能な人の割合 (処理区域内人口/認可区域内人口)	99.5%	99.7%	99.7%	99.5%	99.6%	
1-3-① 合流式下水道改善率	合流式下水道改善率 (分流式下水道並み整備面積/ 合流式下水道整備面積)	71.7%	95.5%	100.0%	100% (H25)	100.0%	予定通りH25事業完了し、本年度検証中。

### 基本目標2. 災害等に強い上下水道の確立

指標名	指標の持つ意味 (算出式)	現状 H20	実績数値		目標 H26	目標 H31	備考
			H24	H25			
2-1-① 浄水場耐震化率	耐震化された浄水施設能力の割合 (耐震性のある施設能力/ 全施設能力)	7.0%	95.4%	95.4%	93.1%	93.1%	目標値に達している。 H23・24広郷浄水場耐震補強工事の実施により。
2-1-① ポンプ場耐震化率	耐震化されたポンプ場能力の割合 (耐震性のある施設能力/ 全施設能力)	29.6%	84.9%	84.9%	92.9%	92.9%	やや遅れている。 耐震基準等の動向を注視していたため。
2-1-① 配水池耐震化率	耐震化された配水池容量の割合 (耐震性のある配水池容量/ 全配水池容量)	9.8%	27.1%	27.1%	25.9%	25.9%	目標値に達している。
2-1-② 水道管路耐震化率	耐震化された水道管路の割合 (耐震管延長/管路総延長)	0.5%	3.3%	3.5%	3.4%	6.1%	目標値に達している。 老朽管更新時に口径中150mm以上の管を耐震化している。
2-1-① 処理場の耐震化率	耐震化された処理場の構造物割合 (耐震性のある構造物数/構造物数)	13.8%	13.8%	13.8%	24.1%	32.2%	やや遅れている。 H26以降北見市浄化センターの耐震化を実施している。
2-1-② 重要な下水幹線等の耐震化率	耐震化された重要な下水幹線等の割合 (耐震管延長/重要な 幹線等延長)	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	10.0%	やや遅れている。 策定した長寿命化計画に基づきH26以降実施予定。
2-1-③ 雨水面積整備率	雨水整備の計画面積に対する浸水対策済みの面積割合 (雨水整備面積/公共下水道 事業認可区域面積)	54.9%	57.7%	58.2%	55.5%	55.9%	目標値に達している。

### 基本目標3. お客様サービスの向上と経営基盤の強化

指標名	指標の持つ意味 (算出式)	現状 H20	実績数値		目標 H26	目標 H31	備考
			H24	H25			
3-1-① アンケート情報収集割合	給水人口に対するアンケート調査回答人数の割合 (アンケート回答人数/給水人口)	0.8%	-	-	1.0%	1.0%	H26アンケート調査を実施した。
3-1-② 上下水道事業に係る情報の提供度	広報誌などによる利用者への情報提供の割合 (広報誌発行部数/給水人口)	2.0%	2.0%	2.0%	3.0%	4.0%	事業にかかる予算・決算、施設整備状況、断水・事故情報など、広報誌、ホームページに掲載した。
3-2-④ 有収率	料金徴収の対象となる水量の割合 (有収水量/給水量)	76.9%	77.4%	78.4%	80.8%	84.4%	やや遅れている。 管の更新や漏水調査を実施しながら漏水防止基本計画に則り進める。

計画の取り組み状況(平成25年度)

【水道項目】

基本目標	主要施策	事業の内容等	取り組み実績(H25)	実績額(百万円)												
安全で快適な生活環境の確保	水源水質の維持・向上に向けた取り組み	水源水質調査、パトロールの継続、関係機関協議会への参加を行い水源水質の維持向上に取り組めます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>「平成25年度 水質検査計画」に基づく原水水質検査の実施</li> <li>・降雨時、融雪時における河川パトロールの実施</li> <li>・「常呂川水系環境保全対策協議会」「常呂川水系清流ルネッサンスⅡ」に参加し、水質浄化対策などを関係機関と協議を行った。</li> <li>・家畜ふん尿対策として、市環境課、訓子府町、JA畜産グループと協議を行い、畜産農家への指導強化を申し入れた。</li> </ul>													
	水質管理体制の充実	毎年度「水道水質検査計画」を策定・実施し、定期的な検査機器の更新を実施します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「平成25年度 水質検査計画」の策定、実施</li> <li>・検査機器の更新 クリプトスポリジウム検査機器・濁度計・水分計 他</li> </ul>	12												
	「水安全計画」の策定	H23までに「水安全計画」を策定し、適宜見直しを行い安定的な水道水の供給に努めます。	・「北見市水安全計画概要版」策定、平成25年4月HPで公表													
	貯水槽水道への積極的な対応	水質の確保された水道水が供給されるよう、水道事業者として積極的に貯水槽水道設置者とともに取り組みます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易専用水道設置者には検査についての文書送付、検査実施。(50/63 検査率 79.4%)</li> <li>・小規模貯水槽水道設置者について検査の重要性について文書送付。(対象施設 328件)</li> </ul>													
	計画的な施設整備と未普及地域の解消	未普及地域の方々への意向調査を行い、費用対効果も検討し、普及率の向上に取り組めます。  ◎数値目標(水道普及率) 水道水を利用している人の割合(給水人口/行政区内人口)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未普及地域解消等事業 豊地地区配水管布設工事 φ150~400mm 201.7 m 北上地区配水管布設工事 φ75~200mm 613.6 m 留辺蘂町地区配水管布設工事 φ50~75mm 199.3 m 西三輪地区配水管布設工事外4件 φ50~150mm 536.6 m</li> <li>・道営農業農村整備事業負担金(留辺蘂町大和地区)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th colspan="2">目標</th> </tr> <tr> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93.9%</td> <td>94.0%</td> <td>96.5%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	実績		目標		H24	H25	H26		93.9%	94.0%	96.5%		69
	実績		目標													
	H24	H25	H26													
	93.9%	94.0%	96.5%													
	汚泥等の有効利用	広郷浄水場においては、H24までに天日乾燥ろ床を整備し、現在産業廃棄物として処分している汚泥の有効利用を検討します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広郷浄水場天日乾燥ろ床建設工事</li> <li>H25~27年度の3か年で、天日乾燥ろ床の工事を実施し、汚泥の有効利用を検討する。</li> </ul>		276											
	建設副産物利用の促進	産業廃棄物の削減やコスト縮減につながる取り組みとして、再生材料の使用や施工方法の検討を継続的に取り組みます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アスファルト再生生材(50%)の利用</li> <li>・水道管浅層埋設による工事期間の短縮、アスファルト廃材等の縮減について、工大との共同研究を実施(H25~)し、検討を始めた。</li> </ul>		3											
	使用エネルギーの低減	「環境計画書」作成の検討や使用エネルギーの少ない機器への更新、配水ブロックの見直しを検討し、環境負荷低減に取り組めます。	・日の出沈砂池耐震補強工事に合わせて、照明器具のLED化を図った。													
	老朽化施設の計画的な更新・延命化	「アセットマネジメント」の策定を行います。	・策定に向け資料の収集													
導送配水管更新事業を実施します。		<ul style="list-style-type: none"> <li>・送配水管更新事業 φ50~450mm 北見 9,193.9 m 端野 m 常呂 44.2 m 留辺蘂 m 計 9,238.1 m</li> </ul>	739													
広郷浄水系統送配水施設更新事業を実施します。		・広郷浄水系統送配水施設更新事業 三輪ポンプ場機械設備等改修工事		51												
金華取水導水配水施設更新事業を実施します。																
吉野取水・導水施設更新事業を検討、実施します。		・平成25年度実施事業は無いが、維持管理により機能を保持														
その他の事業		<ul style="list-style-type: none"> <li>・広郷浄水場混和池等制御装置複数化工事</li> <li>・瑞穂浄水場膜ユニット更新工事</li> </ul>		70												
施設の統廃合による事業の効率化	H28までに、1上水道事業への統合するため統合簡易水道事業などを実施します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温根湯温泉地区統合簡易水道事業 大和地区 道営事業負担金</li> <li>・端野町緋牛内地区を協和地区に統合するための調査費</li> </ul>		141												

【水道項目】

基本目標	主要施策	事業の内容等	取り組み実績(H25)	実績額(百万円)									
災害等に強い上下水道の確立	施設の計画的な耐震化	H25までに重要な基幹施設(広郷浄水場、三輪ポンプ場、日の出沈砂池)については耐震化工事を実施します。 ◎数値目標(浄水場耐震化率) 耐震化された浄水施設能力の割合(耐震性のある施設能力/全施設能力)	・基幹施設耐震化事業 日の出沈砂池耐震補強工事	60									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> </tr> <tr> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95.4%</td> <td>95.4%</td> <td>93.1%</td> </tr> </tbody> </table> 広郷浄水場の補強工事がH24年度完了し、目標値に達した。		実績		目標	H24	H25	H26	95.4%	95.4%	93.1%
			実績		目標								
			H24		H25	H26							
			95.4%		95.4%	93.1%							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> </tr> <tr> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>84.9%</td> <td>84.9%</td> <td>92.9%</td> </tr> </tbody> </table> 大震災に伴い耐震基準等の動向を注視したため、耐震診断を見合わせていた。H26年度中区ポンプ場更新実施設計。	実績		目標	H24	H25	H26	84.9%	84.9%	92.9%			
	実績		目標										
	H24	H25	H26										
	84.9%	84.9%	92.9%										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> </tr> <tr> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27.1%</td> <td>27.1%</td> <td>25.9%</td> </tr> </tbody> </table> 目標値に達している。H26中区配水池耐震診断。	実績		目標	H24	H25	H26	27.1%	27.1%	25.9%			
実績		目標											
H24	H25	H26											
27.1%	27.1%	25.9%											
他のもう一つの施設については順次耐震診断を実施し、耐震性の低い施設は耐震化に向けた検討を行います。	・その他施設耐震化事業 東日本大震災の被災状況により、耐震診断方法の変更が想定されるため、耐震診断は実施していない。												
管路の計画的な耐震化	基幹管路については優先的に、他の管路についても更新と併せ積極的に耐震化に取り組みます。 ◎数値目標(水道管路耐震化率) 耐震化された水道管路の割合(耐震管延長/管路総延長)	・管路耐震化事業 ダクタイル鋳鉄管(GX形) 1,378.0 m ダクタイル鋳鉄管(NS形) 1,098.0 m ポリエチレン管(PE) 136.0 m ステンレス鋼管 0.0 m 計 2,612.0 m	送配水管更新費に計上										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> </tr> <tr> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.3%</td> <td>3.5%</td> <td>3.4%</td> </tr> </tbody> </table> 計画どおり推移している。老朽管更新時に併せて口径φ150mm以上の管は耐震管を採用。		実績		目標	H24	H25	H26	3.3%	3.5%	3.4%	
実績		目標											
H24	H25	H26											
3.3%	3.5%	3.4%											
基幹管路の複数化	北見自治体の9割近くを受け持つ広郷浄水場～三輪ポンプ場までの2系統化工事を実施します。 その他の基幹管路の2系統化事業を検討します。	・平成23年度事業完了 事業年度 H22～H23 総事業費 1,353,918千円 φ150～800 L=2,771.7m											
		・老朽管の布設替えに重点をおき事業を進めているため、現時点では未実施。											
浄水系統間、配水系統間の相互融通	連絡管整備計画の策定を行います。 金華浄水系統～広郷浄水系統連絡管工事を実施します。	・後期計画で実施予定事業											
緊急時における応急給水容量の確保	緊急貯水槽整備計画の策定を行います。 緊急貯水槽整備工事を検討、実施します。	・後期計画で実施予定事業											
応急給水拠点、運搬給水拠点の整備	応急給水拠点、運搬給水拠点整備計画の策定を行います。 配水施設整備に併せた拠点整備に取り組みます。	・給水拠点となる配水池の改築・更新時に併せて整備を実施する予定											
災害復旧体制の充実と関連機関との連携	災害関連マニュアルの整備や緊急資機材の備蓄、水処理情報の一元化や監視カメラの設置及びマッピングシステムの精度向上に取り組みます。	・マッピングシステムデータ更新等	11										
お客様サービスの向上と経営基盤の強化													
有収率の向上	有収率、有効率の向上は事業経営上においても重要課題であるため、継続的に取り組みます。 ◎数値目標(有収率) 料金徴収の対象となる水量の割合(有収水量/給水量)	・有収率の向上 老朽管工事・漏水調査費・修繕工事費 北見市水道事業の漏水防止基本計画に基づき実施	32										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> </tr> <tr> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77.4%</td> <td>78.4%</td> <td>80.8%</td> </tr> </tbody> </table> 前年度と比較すると率は若干向上したが、目標値達成に向け、今後も漏水防止基本計画に則った取組みを進める。		実績		目標	H24	H25	H26	77.4%	78.4%	80.8%	
実績		目標											
H24	H25	H26											
77.4%	78.4%	80.8%											

【下水道項目】

基本目標	主要施策	事業の内容等	取り組み実績(H25)	実績額 (百万円)
安全で快適な生活環境の確保	計画的な施設整備と未普及地域の解消	未普及地域の方々への意向調査を行い、費用対効果も検討し、普及率の向上に取り組みます。	・汚水処理施設整備事業 汚水管整備 φ150~250mm L= 1232.02 m 公共汚水樹の新設	123
		◎数値目標(下水道普及率) 下水道・漁業集落排水が利用可能な人の割合 (処理区域内人口/ 認可区域内人口)	実績 目標 H24 H25 H26 計画どおりに推移している 99.7% 99.7% 99.5%	
	下水道法により義務づけられている分流化整備事業を実施します。	◎数値目標(合流式下水道改善率) 合流式下水道改善率 (分流式下水道並み整備面積/ 合流式下水道整備面積)	・緊急合流改善事業 分流化のための管渠整備 φ200~800mm L=7,741.34m	850
			実績 目標 H24 H25 H25 計画どおり事業完了 95.5% 100.0% 100.0%	
	下水道の利用促進	水洗化率の向上に向けて継続的に啓発活動を行います。	・未水洗家屋の個別訪問を継続的に行った。 対象件数 882件 訪問件数 541件	
	汚泥等の有効利用	下水汚泥については、H26までに全量を有効利用するための検討や施設整備を行い、また消化ガスについても利用の検討をします。	・北見市浄化センター汚泥脱水機設備更新実施設計業務委託	7
	建設副産物利用の促進	産業廃棄物の削減やコスト縮減につながる取り組みとして、再生材料の使用や施工方法の検討を継続的に取り組みます。	・舗装復旧にあたり、アスファルト再生合材(50%)を利用 ・取り壊した既設の舗装合材は、再資源化プラントにおいて処理	
	老朽化施設の計画的な更新・延命化	各自治区処理場と北見自治区管渠のデータベース化に取り組みます。	・北見・留辺蘂・常呂は、H23までに完了。 ・端野町下水道管理センターは、更新計画等策定時にあわせて実施予定	
		長寿命化計画の策定を行います。	・長寿命化計画策定事業 北見・常呂処理場~H24策定済み 留辺蘂処理場~H27策定予定	
		長寿命化対策・改築更新事業を実施します。	・改築更新事業 北見浄化センター機械・電気設備更新工事 (A2系散気装置他更新) 常呂終末処理場機械・電気設備更新工事 (水処理計装設備他更新)	247
災害等に強い上下水道の確立	施設の計画的な耐震化	耐震診断の実施、基本計画の策定を行います。	・処理施設耐震化事業 耐震診断実施 北見市浄化センター・北光ポンプ場・端野・常呂終末処理場	21
		耐震診断の結果と改築更新計画に合わせた耐震化に取り組みます。 ◎数値目標(処理場の耐震化率) 耐震化された処理場の構造物割合 (耐震性のある構造物数/ 構造物数)	実績 目標 H24 H25 H26 北見市浄化センターは、H26以降耐震化 工事を順次予定している 13.8% 13.8% 24.1%	
	管路の計画的な耐震化	耐震化計画の策定に取り組みます。 長寿命化対策や改築更新計画に併せた耐震化に取り組みます。 ◎数値目標 (重要な下水幹線等耐震化率) 耐震化された重要な下水幹線等の割合 (耐震管延長/ 重要な幹線等延長)	・下水道管渠長寿命化計画(山下通地区)策定 ・管路耐震化事業 下水道管渠長寿命化計画(山下通地区)策定業務委託 下水道管渠長寿命化計画基礎調査業務委託 高栄・青葉地区実施設計業務委託	114
	大雨の影響を受けやすい地域から優先的に雨水管整備に取り組みます。 ◎数値目標(雨水面積整備率) 雨水整備の計画面積に対する 浸水対策済み面積割合 (雨水整備面積/公共下水道 事業認可区域面積)	・雨水管整備事業 雨水管整備 φ250~□2,300mm L=2,845.53m 公共雨水樹設置工事(北見)	348	
		実績 目標 H24 H25 H26 計画どおり推移している 道路整備等と併せて効率的に整備を実施している。 57.7% 58.2% 55.5%		

【共通項目】

基本目標	主要施策	事業の内容等	取り組み実績(H25)	実績額 (百万円)								
経営	お客様ニーズの把握と対策	アンケート調査を継続的に実施し、データの蓄積と分析により、お客様サービスの向上に取り組みます。 ◎数値目標(アンケート情報収集割合) 給水人口に対するアンケート調査回答人数の割合 (アンケート回答人数/給水人口)	アンケート調査の実施にかかり、実施時期及びお客様のニーズ調査に対する内容につき検討を行った。									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> <th>H25未実施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H23</td> <td>H24</td> <td>H26</td> <td>実施時期・内容を検討する。</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>1.0%</td> <td>H26実施</td> </tr> </tbody> </table>		実績		目標	H25未実施	H23	H24	H26	実施時期・内容を検討する。
実績		目標	H25未実施									
H23	H24	H26	実施時期・内容を検討する。									
—	—	1.0%	H26実施									
営業	広報活動の充実	各種広報活動を充実させることにより、事業経営についてお客様のご理解と信頼を得るよう取り組みます。  ◎数値目標(上下水道事業に係る情報の提供度)  広報誌などによる利用者への情報提供の割合 (広報誌発行部数/給水人口)	上下水道事業にかかる予算・決算、施設整備の状況、断水・事故情報、お客様が行う届出や収納窓口に関することなど、お客様が必要とする情報や「水道週間」、「下水道の日」についての周知を広報誌及び北見市のホームページにより実施しました。また、水環境保全の大切さを理解していただくため、平成24年度に発行した北見市水道事業60年下水道事業50年記念誌「水のあゆみ」より抜粋した内容を特集として広報誌に掲載し、周知を図った。	2								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> <th rowspan="2">例年行っている特集のほか、記念誌の広報として5回の連載を行った。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>H25</td> <td>H26</td> </tr> <tr> <td>2.0%</td> <td>2.0%</td> <td>3.0%</td> </tr> </tbody> </table>		実績		目標	例年行っている特集のほか、記念誌の広報として5回の連載を行った。	H24	H25	H26	2.0%
実績		目標	例年行っている特集のほか、記念誌の広報として5回の連載を行った。									
H24	H25	H26										
2.0%	2.0%	3.0%										
盤	組織・機構・業務の効率化	継続的に組織・機構・業務を見直すことにより効率的な企業経営に取り組みます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>業務分担等について常に改善点がないか見直し、効率的な経営に努めた。</li> <li>組織機構は、北見市の組織機構の見直しに基づき実施しているが、平成25年度については大きな変更は行わなかった。</li> </ul>									
	財務体質の強化	財政計画の策定、未利用資産の有効利用などを実施し、財務体質の強化に取り組みます。	「北見市上下水道ビジョン」に基づき予算編成を行い執行した。事業の執行に当たっては、収入の確保に努めるとともに、費用の縮減を図った結果、水道事業で、120,493,474円、下水道事業で、201,798,780円のそれぞれ当年度純利益となった。									
のの向強上	適正な事業水準に応じた料金収入の確保	料金及び会計方式の統一により、負担の公平性を図り将来の事業経営の安定を目指します。	(財政状況の開示・料金水準の見直し) ・財政状況の開示 広報5月号(予算)、広報11月号(決算)にて開示。また、ホームページに経営情報として、各種資料を掲載した。 ・料金水準の見直し 上下水道審議会に上下水道料金について諮問を行った(6月10日)。水道料金については、現行を維持、下水道使用料は、必要最小限の改定とすべきとの答申を頂いた。 答申に基づき、平成25年第4回定例会で条例改正案を上程し、平成26年第1回定例会で可決した。 改定内容 下水道使用料 3.9%の改定 平成26年10月実施									
			(収納率向上に向けた取り組み) 納期限までに支払いされない滞納開始から、給水停止に至るまでの期間を短縮するため、督促、給水停止予告に続いて発行していた給水停止執行のはがきを廃止する。 加えて、近年登録連絡先の大半を占める携帯に、直接電話督促を実施する。									
化と	職員研修の充実と技術の継承	安定的に事業を継続できるよう、研修制度の充実や、技術の継承に取り組みます。	北見市企業局職員研修基本計画に基づいた「平成25年度 北見市企業局研修計画」を策定し、本計画の各研修メニューに基づいた、全体・専門別及び外部研修を実施した。	2								





## 2. 上下水道中期経営プラン(後期)の策定について

### 1. 経緯


～安全・安心で持続した水環境の構築をめざして～を基本理念に上下水道事業の今後取組むべき課題や目標を示し、長期的視野に立ったうえで、今後10年間の経営戦略として「北見市上下水道ビジョン」を平成22年3月に策定した。

このビジョンの実現に向け、具体的な年次計画や目標を定めた実施計画として「北見市上下水道中期経営プラン(前期 平成22年度～平成26年度)」を策定し、各取り組み項目の実行にあたっている。

本年度、前期5か年の最終年度を向えることから、事業の進捗状況を把握するとともに事業評価を実施する。

この事業評価結果に基づく計画の見直し及びビジョン策定時からの環境等の変化を踏まえ「北見市上下水道中期経営プラン(後期 平成27～平成31年度)」を策定する。

○北見市上下水道ビジョンの計画期間と中期経営プランの位置づけ

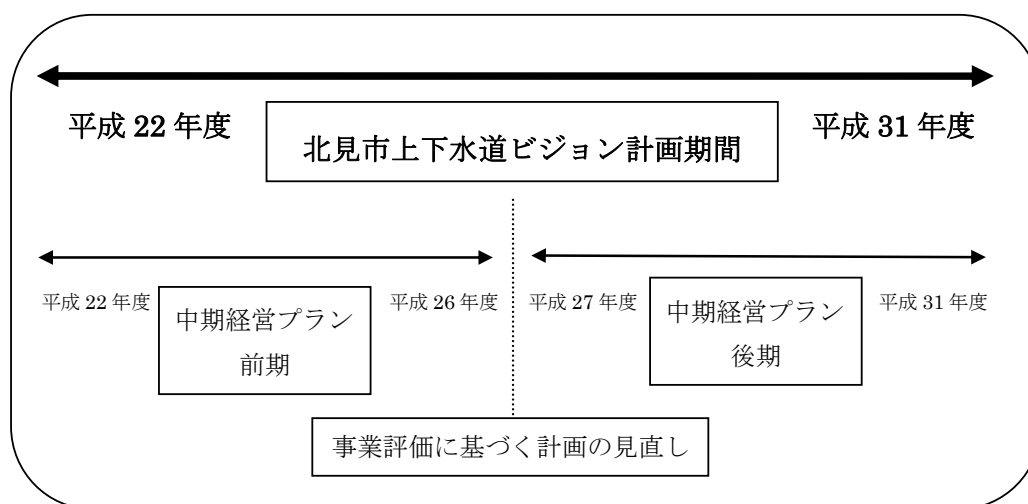

### 2. 策定方針

上下水道ビジョンに掲載した、10年間の事業計画及び数値目標における「平成26年度目標水準」の進捗状況の検証及び事業評価を行い、社会環境等の変化を考慮し、新たに策定された各種計画との整合を取り「平成31年度目標水準」を定める。

### 3. 策定に向けた主な作業

- ①前期計画の進捗状況及び検証
- ②北見市総合計画など新たな各種計画との整合性
  - ・北見市総合計画後期（2014－2018）
  - ・新水道ビジョン（厚生労働省H25.3策定）
  - ・新下水道ビジョン（国土交通省H26.7策定）
- ③水需要の予測
- ④建設改良事業（27年度～31年度）計画の策定
- ⑤アンケート調査の分析
- ⑥収支計画
- ⑦数値目標の設定
- ⑧ビジョン項目の追加及び変更

### 4. スケジュール

- |     |        |  |
|-----|--------|--|
| 26年 | 9月～10月 | ・検証作業（H26年度末での現状把握・評価）<br>・アンケート調査の分析<br>・建設事業計画策定<br>・H31年度目標水準の決定<br>・水需要予測・収支計画 |
|     | 11月末   | 後期計画（案）策定  |
|     | 12月中旬  | 上下水道審議会開催予定（策定案審議）   |
| 27年 | 2月上旬   | 上下水道審議会開催予定  |
|     | 2月中旬   | 議会報告   |
